INFORME DE DESEMPEÑO

CasaScore (AlquilaPuno)

Fecha: viernes 06/11/2026 (semana 11) | **Versión:** 1.0 | **Fase:** Monitoreo

1. Datos Generales

Proyecto:	CasaScore (aplicación AlquilaPuno)
Responsable:	Ruth Karina Apaza Solis – Analista de Planificación
Proceso PM4DEV:	Monitoreo (cronograma, presupuesto y riesgos)
Insumos:	Línea base del cronograma y de costos, control del proyecto, actas de sprint y registro de riesgos
Fecha de corte:	viernes 06/11/2026 (fin de la semana 11)

2. Resumen del Corte

CRONOGRAMA	COSTO	AVANCE	CUARTOS
0.87	0.95	57.9 %	10 / 15
SPI (0.56 en la semana 6)	CPI dentro del margen	del proyecto (plan: 66.5 %)	registrados para el piloto

- Los documentos de planificación quedaron revisados y firmados en las semanas 9 y 10, y se entregaron la guía de marcos de referencia y el Plan de Dirección: la rama de gestión está al día.
- El atraso se concentra ahora en la ruta crítica: la migración a Supabase va al 40 % cuando debía ir al 89 %, lo que equivale a cerca de una semana de atraso.
- El costo sigue en el margen (CPI de 0.95). Si se mantiene, el costo final sería S/ 11,700.40, S/ 36.93 por encima de la línea base de costos; la diferencia solo podría cubrirse con la reserva de gestión mediante una solicitud de cambio. Los costos reales son simulados a partir del registro de horas y gastos.

3. Valor Ganado al Corte


Valores en soles. El presupuesto del trabajo (BAC) es S/ 11,108.07; la contingencia se controla aparte.

Cód.	Actividad	BAC	PV	% real	EV	AC	SV	CV
1.1	Gobernanza del equipo	372.65	372.65	100 %	372.65	372.65	0.00	0.00
1.2	Viabilidad y Acta de Constitución	372.65	372.65	100 %	372.65	380.10	0.00	-7.45
1.3	Planificación base	496.86	496.86	100 %	496.86	546.55	0.00	-49.69
1.4	Planes de soporte	372.65	372.65	100 %	372.65	395.01	0.00	-22.36
1.5	Seguimiento y control	1,061.03	544.35	nivel	544.35	544.35	0.00	0.00
1.6	Entregas de la Unidad II	372.65	372.65	100 %	372.65	383.83	0.00	-11.18
2.1	Ficha técnica y requerimientos	372.65	372.65	100 %	372.65	372.65	0.00	0.00
2.2	Modelo de datos y arquitectura	372.65	372.65	100 %	372.65	391.28	0.00	-18.63
2.3	Diseño de pantallas	248.43	248.43	100 %	248.43	258.37	0.00	-9.94
3.1	Motor CASA SCORE	496.86	496.86	100 %	496.86	536.61	0.00	-39.75
3.2	Publicación de cuartos	372.65	372.65	100 %	372.65	395.01	0.00	-22.36
3.3	Ranking y detalle (MVP Unidad I)	1,034.45	1,034.45	100 %	1,034.45	1,106.86	0.00	-72.41
3.4	Nube, registro e inicio de sesión	827.76	735.79	40 %	331.10	370.84	-404.68	-39.73
3.5	Punto de referencia y nuevos criterios	496.86	496.86	20 %	99.37	104.34	-397.49	-4.97
4.1	Pruebas del motor	248.43	248.43	100 %	248.43	260.85	0.00	-12.42
4.2	Levantamiento de cuartos	474.43	474.43	67 %	317.87	349.65	-156.56	-31.79
Total al corte			**7,385.01**		**6,426.28**	**6,768.95**	**-958.73**	**-342.68**

4. Evolución de los Indicadores

Indicador	Corte semana 6 (02/10)	Corte semana 11 (06/11)	Tendencia
PV	4,691.79	**7,385.01**	–
EV	2,623.86	**6,426.28**	–
AC	2,736.33	**6,768.95**	–
SV	-2,067.93	**-958.73**	Mejora
CV	-112.47	**-342.68**	Empeora leve
SPI	0.56	**0.87**	Mejora
CPI	0.96	**0.95**	Empeora leve
EAC	11,584.21	**11,700.40**	Empeora leve
VAC	-476.14	**-592.33**	Empeora leve
TCPI	1.01	**1.08**	–

5. Curva S

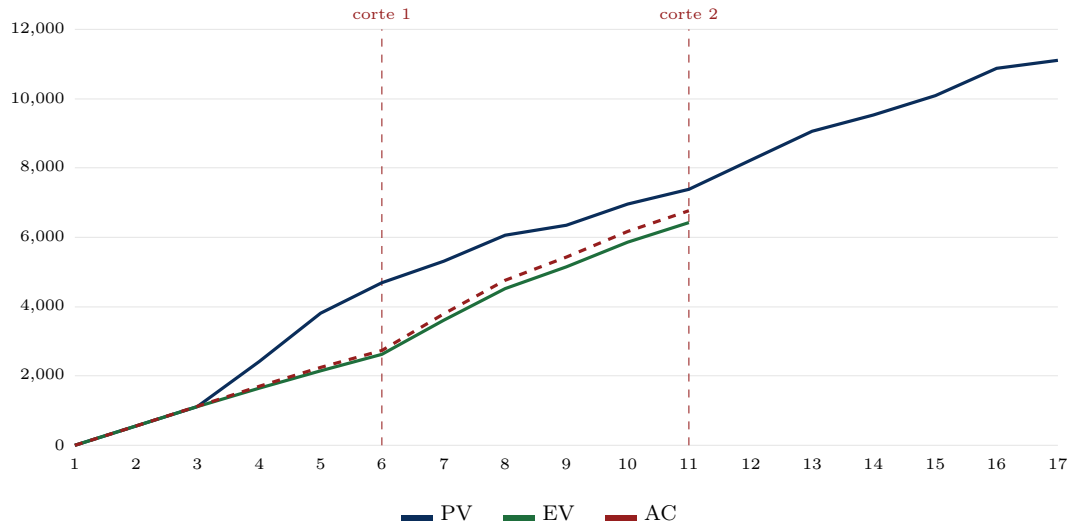

6. Variación del Cronograma

Hito	Línea base	Pronóstico	Variación
Plan de Dirección del Proyecto	26/10 (sem. 10)	26/10 (real)	a tiempo
Registro e inicio de sesión con Supabase	10/11 (sem. 12)	18/11 (sem. 13)	+6 días
Piloto con clientes	17/11 (sem. 13)	25/11 (sem. 14)	+6 días
MVP final aceptado	25/11 (sem. 14)	02/12 (sem. 15)	+5 días
Informe final y exposición	14/12 (sem. 17)	14/12 (sem. 17)	a tiempo
Acta de cierre	16/12 (sem. 17)	18/12 (sem. 17)	+2 días

El cierre sigue dentro de la semana 17 porque el retraso consume la holgura del proyecto (0.40 semanas) y se recupera en las actividades de cierre, que no se detienen en la semana de exámenes finales. El piloto no puede hacerse en la semana 13 sin el registro en la nube: se requiere una solicitud de cambio.

7. Variación del Presupuesto

Rubro	Previsto al corte	Real al corte	Variación	%	Causa
Personal regular	4,765.91	4,333.15	-432.76	-9 %	Horas registradas según el avance real.
Horas extra	501.80	501.80	0.00	0 %	Dos jornadas nocturnas para el ranking (semanas 7 y 8).
Equipos	756.00	756.00	0.00	0 %	Depreciación según el tiempo.
Servicios	444.50	444.50	0.00	0 %	Gasto fijo mensual.
Productos de salud	254.80	198.00	-56.80	-22 %	Compras menores a las previstas.
Alimentación	520.00	431.50	-88.50	-17 %	Menos reuniones presenciales.
Transporte	142.00	104.00	-38.00	-27 %	Visitas de campo los sábados.
Licencias	0.00	0.00	0.00	–	La cuenta de Google Play se paga en la semana 12.
Documentación y piloto	0.00	0.00	0.00	–	Sin gastos aún.
Total	**7,385.01**	**6,768.95**	**-616.06**	**-8 %**	

8. Riesgos Actualizados

ID	Riesgo	Antes	Ahora	Situación y respuesta	Estado
R02	Retraso en la migración a Supabase	6	9	El disparador se activó: el inicio de sesión no funcionaba al cierre de la semana 10. Ruth apoya en la configuración de la seguridad por fila y Eliseo se concentra en el registro.	Activado
R01	Pocos propietarios dispuestos a publicar	6	6	10 de 15 cuartos registrados; las visitas de los sábados no alcanzan la meta. Se evaluará reducirla.	En vigilancia
R07	Baja adopción en el piloto	6	4	14 arrendatarios inscritos por los grupos de WhatsApp y los afiches; la probabilidad baja.	En vigilancia
R08	Nuevo: el piloto no puede hacerse en la semana 13 por el atraso de la nube	–	6	Proponer el cambio del piloto a la semana 14, manteniendo el MVP final en la semana 16.	Nuevo
R05	Enfermedad o ausencia de un integrante	4	4	Sin ausencias en el periodo.	Sin cambio
R06	Límites del plan gratuito	4	4	Uso de Supabase menor al 10 % de sus límites.	Sin cambio
R03	Falla o robo de un equipo	3	3	Sin incidentes.	Sin cambio
R04	Alza de precios	2	2	Gasto en efectivo menor al previsto.	Sin cambio

La contingencia (S/ 555.40) sigue sin uso.

9. Recomendaciones al Equipo

N.º	Recomendación	Responsable
1	Presentar la solicitud de cambio para mover el piloto a la semana 14.	Ruth K. Apaza Solis
2	Evaluar si la meta de 15 cuartos es alcanzable antes del piloto.	Clyde N. Paricahua Pari
3	Mantener el apoyo en la migración a Supabase hasta que el registro funcione.	Eliseo Tarqui Ajahuana

10. Firmas

En señal de conformidad con el presente documento, los integrantes del equipo firman a continuación:

Clyde Neil Paricahua Pari
Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis
Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana
Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe
Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación
