EDT Y DICCIONARIO DE LA EDT

CasaScore (AlquilaPuno)

Fecha: viernes 18/09/2026 (semana 4) | **Versión:** 1.0 | **Fase:** Planificación

1. Datos Generales


Proyecto:	CasaScore (AlquilaPuno)
Responsable:	Ruth Karina Apaza Solis – Analista de Planificación
Proceso PM4DEV:	Gestión del alcance
Insumos:	Acta de Constitución, especificación de requerimientos y registro de interesados

2. Cómo se Construyó la EDT

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) divide todo el proyecto en partes pequeñas que se pueden asignar, estimar y controlar.

- **Primer nivel:** 5 ramas organizadas por entregables: gestión, análisis y diseño, construcción, pruebas con clientes y cierre.
- **Segundo nivel:** paquetes de trabajo de 3 a 5 días hábiles cada uno, con un único responsable.
- **Regla del 100 %:** la EDT contiene todo el trabajo del proyecto y nada más. La suma de los paquetes es igual al esfuerzo total planificado.
- **Horas y costo:** las horas son del equipo completo; el responsable dirige el paquete y los demás integrantes apoyan. El costo usa la tarifa promedio del equipo (S/ 12.0625 por hora, con EsSalud).

3. Diagrama de la EDT

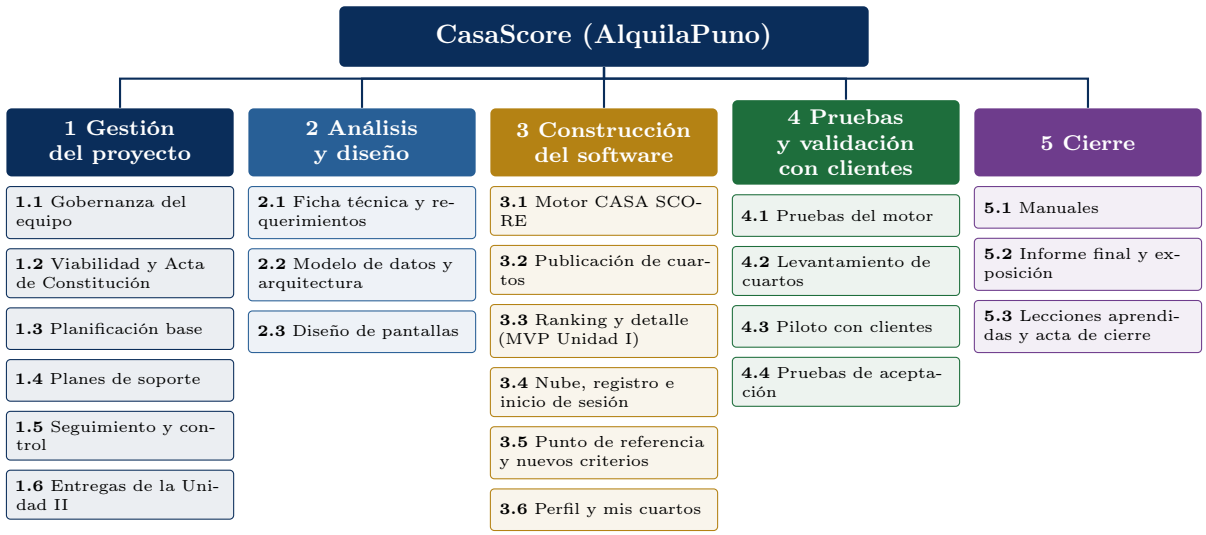

4. Diccionario de la EDT

Cód.	Paquete	Descripción	Criterio de aceptación	Resp.	Sem.	Horas	Costo (S/)
1	**Gestión del proyecto**					**168**	**2,026.50**
1.1	Gobernanza del equipo	Políticas, acta de conformación y acta de compromiso.	Documentos firmados por los 4 integrantes.	Viviana	2–3	24	289.50
1.2	Viabilidad y Acta de Constitución	Business Case con ROI, VAN y payback; Acta con objetivos SMART.	Acta aprobada por el equipo y visto bueno del asesor.	Clyde	3	24	289.50
1.3	Planificación base	Interesados, EDT, plan del equipo, cronograma y presupuesto.	Líneas base de alcance, tiempo y costo aprobadas.	Ruth	4	32	386.00
1.4	Planes de soporte	Riesgos, calidad, información y contratos.	Cuatro planes aprobados en la reunión de equipo.	Viviana	5	24	289.50
1.5	Seguimiento y control	Actas de sprint, valor ganado, tablero y solicitudes de cambio.	Acta e informe de avance cada semana.	Ruth	6–16	40	482.50
1.6	Entregas de la Unidad II	Guía PMBOK y Plan de Dirección del Proyecto.	Documentos entregados en las semanas 9 y 10.	Clyde	9–10	24	289.50
2	**Análisis y diseño**					**64**	**772.00**
2.1	Ficha técnica y requerimientos	Propuesta, requisitos funcionales y no funcionales y reglas del puntaje.	Requerimientos firmados por el equipo.	Eliseo	2	24	289.50
2.2	Modelo de datos y arquitectura	Modelo entidad–relación, capas de la arquitectura y servicios en la nube.	Modelo revisado por otro integrante.	Eliseo	5	24	289.50
2.3	Diseño de pantallas	Bocetos de ranking, detalle, publicar cuarto y perfil.	Bocetos validados con 3 estudiantes.	Eliseo	5	16	193.00
3	**Construcción del software**					**160**	**1,930.00**
3.1	Motor CASA SCORE	Normalización 0–100, suma ponderada, bonificaciones y penalizaciones.	5 cuartos de prueba en el orden esperado.	Eliseo	4–5	32	386.00
3.2	Publicación de cuartos	Formulario guiado con 4 fotos y almacenamiento local.	Un cuarto completo se publica en 10 minutos o menos.	Eliseo	6	24	289.50
3.3	Ranking y detalle (MVP Unidad I)	Lista ordenada y desglose del puntaje.	Ranking en menos de 250 ms.	Eliseo	7–8	24	289.50
3.4	Nube, registro e inicio de sesión	Migración a Supabase, cuentas por rol y seguridad por fila.	Cada rol ve solo lo que le corresponde.	Eliseo	9–12	32	386.00

Cód.	Paquete	Descripción	Criterio de aceptación	Resp.	Sem.	Horas	Costo (S/)
3.5	Punto de referencia y nuevos criterios	Punto en el mapa, distancia automática, baño y seguridad.	Distancia calculada con un error menor a 50 m.	Eliseo	11–12	32	386.00
3.6	Perfil y mis cuartos	Preferencias guardadas y gestión de cuartos del propietario.	Editar u ocultar un cuarto funciona sin errores.	Eliseo	13	16	193.00
4	**Pruebas y validación con clientes**					**72**	**868.50**
4.1	Pruebas del motor	Casos de prueba del puntaje y del formulario.	100 % de casos aprobados.	Viviana	7	16	193.00
4.2	Levantamiento de cuartos	Visitas a propietarios para registrar cuartos reales.	Al menos 15 cuartos reales registrados.	Clyde	6	16	193.00
4.3	Piloto con clientes	Prueba con 10 estudiantes y 5 propietarios con encuesta.	80 % o más satisfechos (4/5 o más).	Ruth	13	24	289.50
4.4	Pruebas de aceptación	Pruebas finales del MVP antes de la entrega.	0 errores críticos abiertos.	Viviana	15	16	193.00
5	**Cierre**					**48**	**579.00**
5.1	Manuales	Manual de usuario y manual técnico.	Revisados por otro integrante.	Eliseo	15	16	193.00
5.2	Informe final y exposición	Expediente consolidado, diapositivas y demostración.	Entregado el 14/12/2026.	Clyde	16–17	24	289.50
5.3	Lecciones aprendidas y acta de cierre	Registro de lecciones y aceptación formal.	Acta firmada por el equipo y visto bueno del asesor.	Viviana	17	8	96.50
Total del proyecto						**512**	**6,176.00**

5. Resumen por Rama

Rama	Distribución del esfuerzo	Horas	Costo S/	%
1 Gestión del proyecto		168	2,026.50	32.8 %
2 Análisis y diseño		64	772.00	12.5 %
3 Construcción del software		160	1,930.00	31.2 %
4 Pruebas y validación con clientes		72	868.50	14.1 %
5 Cierre		48	579.00	9.4 %
Total		**512**	**6,176.00**	**100 %**

Verificación de la regla del 100 %: 4 integrantes × 8 h semanales × 16 semanas = 512 h, igual a la suma de los paquetes. El costo de personal (S/ 6,176.00) coincide con el del análisis de viabilidad.

6. Firmas

En señal de conformidad con la presente EDT, los integrantes del equipo firman a continuación:

Clyde Neil Paricahua Pari
Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis
Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana
Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe
Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación
