CONTROL DEL PROYECTO

CasaScore (AlquilaPuno)

Fecha: viernes 02/10/2026 (semana 6) | **Versión:** 1.0 | **Fase:** Monitoreo

1. Datos Generales

Proyecto:	CasaScore (aplicación AlquilaPuno)
Responsable:	Ruth Karina Apaza Solis – Analista de Planificación
Proceso PM4DEV:	Monitoreo y control (cronograma y presupuesto)
Insumos:	Línea base del cronograma, presupuesto, actas de sprint y registro de horas y gastos
Fecha de corte:	viernes 02/10/2026 (fin de la semana 6)

2. Método

El avance se mide con la gestión del valor ganado (EVM). Cada actividad de la EDT tiene un presupuesto (BAC); al corte se compara lo que debía estar hecho (PV), el valor de lo realmente hecho (EV = % real × BAC) y lo que costó (AC). El presupuesto del trabajo es S/ 11,108.07; la contingencia (S/ 555.40) se controla aparte. Los costos reales de este informe son simulados a partir del registro de horas y gastos del equipo.

3. Tablero de Control

CRONOGRAMA	COSTO	AVANCE	EFECTIVO
0.56	0.96	23.6 %	646.92
SPI: atraso equivalente a 2 semanas	CPI: dentro del margen de 0.95	del proyecto (plan: 42.2 %)	gastado de S/ 774.85 previstos al corte

RIESGOS ALTOS	CAMBIOS	CUARTOS	CONTINGENCIA
3	1	4 / 15	555.40
R01, R02 y R07 en vigilancia	SC-01 rechazada	registrados para el piloto	sin uso al corte

4. Valor Ganado por Actividad

Se muestran las actividades con valor planificado o ganado al corte. Valores en soles.


Cód.	Actividad	BAC	PV	% real	EV	AC	SV	CV
1.1	Gobernanza del equipo	372.65	372.65	100 %	372.65	372.65	0.00	0.00
1.2	Viabilidad y Acta de Constitución	372.65	372.65	100 %	372.65	380.10	0.00	-7.45
1.3	Planificación base	496.86	496.86	40 %	198.74	222.59	-298.12	-23.85
1.4	Planes de soporte	372.65	372.65	10 %	37.27	37.27	-335.38	0.00
1.5	Seguimiento y control	1,061.03	83.04	nivel	83.04	83.04	0.00	0.00
2.1	Ficha técnica y requerimientos	372.65	372.65	100 %	372.65	372.65	0.00	0.00
2.2	Modelo de datos y arquitectura	372.65	372.65	60 %	223.59	234.77	-149.06	-11.18
2.3	Diseño de pantallas	248.43	248.43	50 %	124.22	129.18	-124.22	-4.97
3.1	Motor CASA SCORE	496.86	496.86	100 %	496.86	536.61	0.00	-39.75
3.2	Publicación de cuartos	372.65	372.65	60 %	223.59	237.01	-149.06	-13.42
3.3	Ranking y detalle (MVP Unidad I)	1,034.45	443.34	0 %	0.00	0.00	-443.34	0.00
4.1	Pruebas del motor	248.43	212.94	0 %	0.00	0.00	-212.94	0.00
4.2	Levantamiento de cuartos	474.43	474.43	25 %	118.61	130.47	-355.82	-11.86
Total al corte			**4,691.79**		**2,623.86**	**2,736.33**	**- 2,067.93**	**-112.48**

5. Indicadores

Sigla	Indicador	Significado o fórmula	Valor
PV	Valor planificado	Costo del trabajo que debía estar hecho	**4,691.79**
EV	Valor ganado	Costo presupuestado del trabajo realmente hecho	**2,623.86**
AC	Costo real	Lo que realmente costó ese trabajo	**2,736.33**
SV	Variación del cronograma	EV − PV	**-2,067.93**
CV	Variación del costo	EV − AC	**-112.48**
SPI	Índice de cronograma	EV / PV	**0.56**
CPI	Índice de costo	EV / AC	**0.96**
EAC	Estimación al concluir	BAC / CPI	**11,584.23**
ETC	Estimación hasta concluir	EAC − AC	**8,847.90**
VAC	Variación al concluir	BAC − EAC	**-476.16**
TCPI	Desempeño requerido	(BAC − EV) / (BAC − AC)	**1.01**

Lectura: el equipo hizo el 56 % del trabajo previsto al corte; el valor ganado (S/ 2,623.86) equivale al valor planificado de la semana 4, por lo que el atraso es de **dos semanas**. El costo está controlado: por cada sol gastado se obtuvieron S/ 0.96 de trabajo. Si el CPI se mantiene, el proyecto costaría S/ 11,584.23, monto que aún entra en la línea base de costos (S/ 11,663.47) gracias a la contingencia.

6. Curva S al Corte

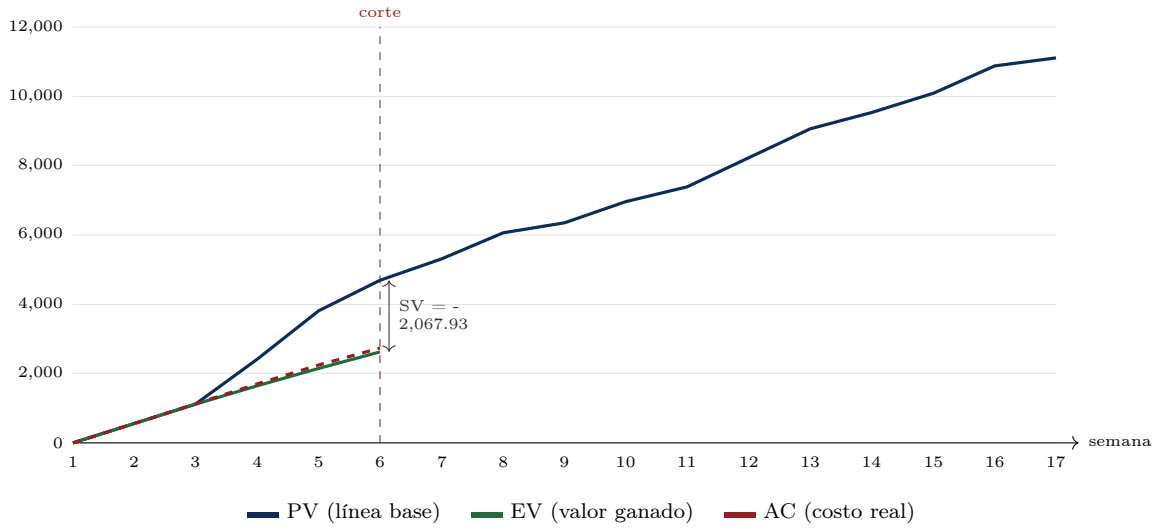

7. Solicitud de Cambio SC-01

Datos de la solicitud

Código y fecha:	SC-01 · presentada el martes 29/09/2026 (semana 6)
Solicitante:	Ruth Karina Apaza Solis – Analista de Planificación
Cambio propuesto:	Aumentar la dedicación de cada integrante de 8 a 10 horas semanales desde la semana 7 hasta la semana 17, usando parte de las horas liberadas por la exclusión de Horus Sentinel.
Justificación:	Recuperar el atraso de dos semanas antes del piloto de la semana 13.

Análisis de impacto

Área	Impacto	Efecto
Alcance	Sin cambio: se mantienen los requisitos del MVP.	Neutro
Cronograma	88 horas adicionales del equipo (2 h × 4 integrantes × 11 semanas), equivalentes a 2.75 semanas de trabajo: recuperaría el atraso hacia la semana 13.	Positivo
Costo	S/ 1,061.50 más de personal valorizado (88 h × S/ 12.0625); el presupuesto total pasaría de S/ 12,829.82 a S/ 13,891.32.	Negativo
Calidad	Más tiempo para pruebas y correcciones.	Positivo
Equipo y riesgos	Mayor carga junto con los exámenes parciales (semana 9) y las demás asignaturas; aumenta el riesgo de ausencias y de baja calidad por cansancio.	Negativo

Decisión del equipo (sponsor): RECHAZADA por unanimidad en la reunión de control del martes 29/09/2026. El aumento de costo y la carga académica pesan más que la recuperación del plazo. Se mantiene la dedicación de 8 horas semanales.

Acción alternativa aprobada: plan de recuperación sin horas adicionales: ejecutar en paralelo el ranking y la revisión de los documentos de planificación, levantar cuartos los sábados dentro de las 8 horas, y concentrar la revisión de documentos en las semanas 9 y 10, cuando el desarrollo se detiene por exámenes.

8. Registro de Cambios

Código	Fecha	Cambio	Solicitante	Estado	Decisión
SC-01	29/09/2026	Aumentar la dedicación de 8 a 10 horas semanales	Ruth K. Apaza Solis	Rechazada	29/09/2026

9. Informe de Variación del Presupuesto

Comparación entre el costo previsto al corte según la línea base y el costo real registrado.

Rubro	Previsto al corte	Real al corte	Variación	%	Causa
Personal regular	3,222.28	1,609.81	-1,612.47	-50 %	Menos horas registradas que las planificadas.
Horas extra	215.06	0.00	-215.06	-100 %	Aún no se realizó la jornada nocturna prevista.
Equipos	479.60	479.60	0.00	0 %	Depreciación según el tiempo transcurrido.
Servicios	282.02	282.02	0.00	0 %	Gasto fijo mensual.
Productos de salud	163.83	120.50	-43.33	-26 %	Compras menores a las previstas.
Alimentación	245.86	198.40	-47.46	-19 %	Menos reuniones presenciales.
Transporte	83.14	46.00	-37.14	-45 %	Menos visitas de campo por el atraso del levantamiento.
Total	**4,691.79**	**2,736.33**	**-1,955.46**	**-42 %**	

El gasto real es menor al previsto porque se hizo menos trabajo, no porque se ahorrara: por eso la variación del presupuesto debe leerse junto con el valor ganado. El gasto en efectivo al corte es de S/ 646.92 frente a S/ 774.85 previstos.

10. Acciones Correctivas

Acción	Responsable	Hasta
Construir el ranking y el detalle en paralelo con la revisión de documentos	Eliseo Tarqui Ajahuana	09/10
Completar el levantamiento de cuartos con visitas los sábados	Clyde N. Paricahua Pari	Semana 12
Revisar y firmar los documentos de planificación en las semanas de exámenes	Viviana M. Quisbert Quispe	Semana 10
Registrar las horas reales cada día en el Issue de cada tarea	Todos	Permanente

11. Firmas

En señal de conformidad con el presente documento, los integrantes del equipo firman a continuación:

Clyde Neil Paricahua Pari
Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis
Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana
Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe
Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación
