REGISTRO DE INTERESADOS

CasaScore (AlquilaPuno)

Fecha: viernes 18/09/2026 (semana 4) | **Versión:** 1.0 | **Fase:** Planificación

1. Datos Generales

Proyecto:	CasaScore (aplicación AlquilaPuno)
Responsable:	Clyde Neil Paricahua Pari – Project Manager
Proceso PM4DEV:	Gestión de interesados (Planificar – Hacer – Verificar – Adaptar)
Insumos:	Acta de Constitución, especificación de requerimientos y viabilidad del proyecto

2. Método de Clasificación

Un interesado es toda persona u organización que puede influir en el proyecto o verse afectada por él. Cada interesado se califica con dos valores de 1 a 5:

- **Poder:** capacidad de cambiar el rumbo del proyecto (aprobar, financiar, usar o dejar de usar el producto).
- **Interés:** cuánto le importan los resultados del proyecto.

Un valor de 4 o 5 se considera alto. La combinación de ambos ubica al interesado en uno de cuatro cuadrantes, y cada cuadrante define cómo se le involucra:


Estrategia	Poder / Interés	Qué significa
Gestionar de cerca	Alto / Alto	Participa en las decisiones y en las pruebas; se le consulta en cada sprint.
Mantener satisfecho	Alto / Bajo	Se atienden sus condiciones para que apoye el proyecto, sin cargarlo de detalles.
Mantener informado	Bajo / Alto	Recibe avances periódicos y se escuchan sus opiniones.
Monitorear	Bajo / Bajo	Se revisa de vez en cuando por si cambia su situación.

3. Registro de Interesados

El arrendatario no se limita a estudiantes: es cualquier persona natural que busque cuarto en la ciudad de Puno, residente en el Perú. Por ahora no se atiende a usuarios extranjeros.

ID	Interesado	Tipo	Interés principal	Poder	Interés	Estrategia
I1	Team Sobrevivientes (sponsor y dueño)	Interno	Producto viable para concursos y uso real	5	5	Gestionar de cerca
I2	Arrendatarios estudiantes (UNA Puno e institutos)	Externo	Cuarto seguro, barato y cerca de su centro de estudios	4	5	Gestionar de cerca
I3	Propietarios y arrendadores de Puno	Externo	Publicar fácil y llegar a inquilinos serios	4	4	Gestionar de cerca
I4	Arrendatarios trabajadores y familias	Externo	Cuarto cerca de su trabajo o de los colegios	3	4	Mantener informado
I5	Docente asesor	Externo	Aplicación correcta de la gestión de proyectos	4	3	Mantener satisfecho
I6	Organizadores de concursos de la UNA Puno y ferias	Externo	Proyectos innovadores y bien sustentados	4	2	Mantener satisfecho
I7	Anunciantes locales	Externo	Llegar a personas que buscan cuarto	2	3	Monitorear
I8	Proveedores de servicios (Supabase, Google Play)	Externo	Cumplimiento de sus términos de uso	3	1	Monitorear

4. Matriz Poder–Interés

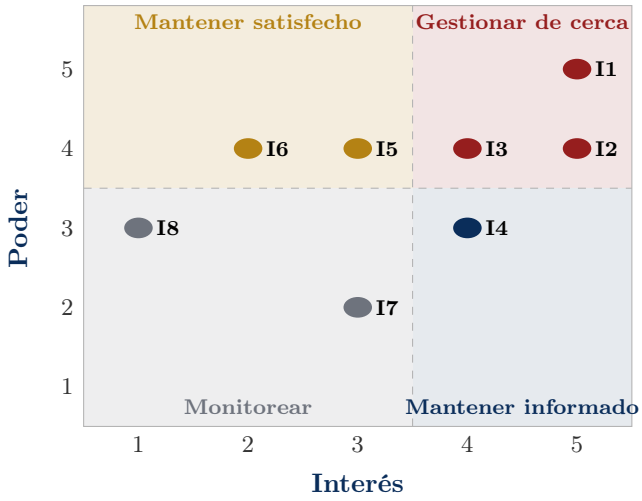

5. Plan de Involucramiento

ID	Acciones	Frecuencia y canal	Responsable
I1	Aprobar actas, planes y cambios mayores; revisar avances, riesgos y gastos.	Martes y viernes, reunión de equipo	Clyde N. Paricahua Pari
I2	Entrevistas para definir pesos y penalizaciones; piloto con 10 estudiantes; encuesta de satisfacción.	Semanas 6, 13 y 15; Google Forms	Viviana M. Quisbert Quispe
I3	Visitas para levantar cuartos; guía corta y acompañamiento para publicar; encuesta sobre el formulario.	Semanas 6 y 13; visita y WhatsApp	Clyde N. Paricahua Pari
I4	Mensajes con los avances y una invitación a probar la app al cierre del piloto.	Semanas 13 y 16; redes sociales	Viviana M. Quisbert Quispe
I5	Presentar cada entregable del curso y aplicar sus observaciones.	Cada entrega del curso	Clyde N. Paricahua Pari
I6	Revisar bases de concursos y preparar la postulación con el MVP.	Semanas 16 y 17	Ruth K. Apaza Solis
I7	Lista de negocios cercanos a centros de estudio para contactar en el año 1.	Semana 17	Ruth K. Apaza Solis
I8	Revisar cambios en los términos y límites de la capa gratuita.	Mensual	Eliseo Tarqui Ajahuana

6. Necesidades que se Convierten en Requisitos

Interesado	Necesidad expresada	Requisito
Arrendatarios (I2, I4)	Estar cerca de su universidad, trabajo o colegio, no solo de la UNA	RF-03 Punto de referencia
Arrendatarios (I2, I4)	Saber por qué un cuarto tiene ese puntaje	RF-07 Explicación del puntaje
Arrendatarios (I2, I4)	Conocer las reglas de convivencia antes de visitar	RF-02 y penalizaciones
Propietarios (I3)	Publicar rápido desde el celular	RF-02 y RNF-05
Equipo (I1)	Operar sin costo durante el semestre	RNF-07 Costo

7. Seguimiento del Registro

- **Verificar:** cada martes se revisa si algún interesado cambió de poder, de interés o de postura.
- **Adaptar:** al cierre de cada fase se actualiza este registro y su plan de involucramiento.
- **Registro de cambios:** toda actualización se guarda como una nueva versión en el repositorio.

8. Firmas

En señal de conformidad con el presente registro, los integrantes del equipo firman a continuación:

Clyde Neil Paricahua Pari
Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis
Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana
Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe
Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación
