REGISTRO DE INTERESADOS

Horus Sentinel

Fecha: viernes 18/09/2026 (semana 4) | **Versión:** 1.0 | **Fase:** Planificación

1. Datos Generales

Proyecto:	Horus Sentinel
Responsable:	Clyde Neil Paricahua Pari – Project Manager
Zona piloto:	Puno (cercado)
Proceso PM4DEV:	Gestión de interesados (Planificar – Hacer – Verificar – Adaptar)
Insumos:	Acta de Constitución, especificación de requerimientos y viabilidad del proyecto

2. Método de Clasificación


Cada interesado se califica con dos valores de 1 a 5: **poder** (capacidad de cambiar el rumbo del proyecto: financiarlo, entregar datos o usar el mapa) e **interés** (cuánto le importan sus resultados). Un valor de 4 o 5 se considera alto.

Estrategia	Poder / Interés	Qué significa
Gestionar de cerca	Alto / Alto	Participa en las decisiones y en las pruebas.
Mantener satisfecho	Alto / Bajo	Se atienden sus condiciones para que apoye el proyecto.
Mantener informado	Bajo / Alto	Recibe avances y se escuchan sus opiniones.
Monitorear	Bajo / Bajo	Se revisa de vez en cuando.

3. Registro de Interesados

ID	Interesado	Tipo	Interés principal	Poder	Interés	Estrategia
I1	Team Sobrevivientes (sponsor y dueño)	Interno	Producto viable y financiado	5	5	Gestionar de cerca
I2	Municipalidad Provincial de Puno	Externo	Prevención del delito con datos; posible convenio de S/ 500 al mes	5	4	Gestionar de cerca
I3	Policía Nacional (comisaría del cercado)	Externo	Patrullaje eficiente; custodia datos reservados	5	2	Mantener satisfecho
I4	Docente asesor	Externo	Aplicación correcta de la gestión de proyectos	4	3	Mantener satisfecho
I5	Serenazgo municipal	Externo	Priorizar el patrullaje por zona y horario	3	4	Mantener informado
I6	Juntas vecinales del cercado	Externo	Barrios más seguros; fuente de reportes ciudadanos	2	5	Mantener informado
I7	Ciudadanos y estudiantes del cercado	Externo	Desplazarse por rutas más seguras	2	4	Mantener informado
I8	Proveedores (servidor y mapas abiertos)	Externo	Cumplimiento de sus términos de uso	3	1	Monitorear

4. Matriz Poder–Interés

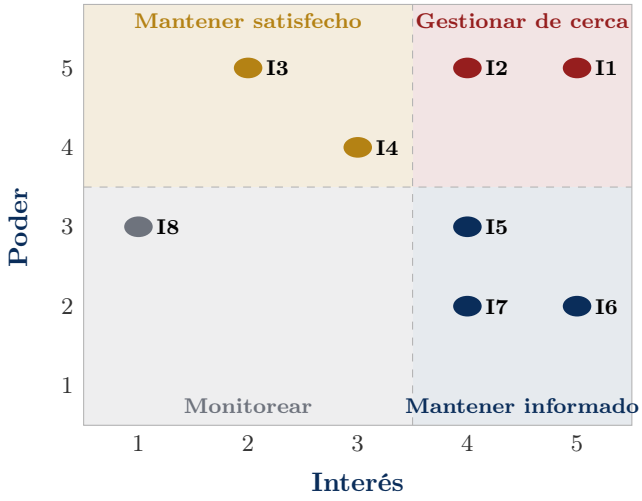

5. Plan de Involucramiento

ID	Acciones	Frecuencia y canal	Responsable
I1	Aprobar planes y cambios; decidir la continuidad del proyecto con el cronograma y el presupuesto detallados.	Martes y viernes, reunión de equipo	Clyde N. Paricahua Pari
I2	Presentar el prototipo y la propuesta de convenio (S/ 500 al mes por mantenimiento y reportes).	Semanas 9 y 15; reunión y oficio	Clyde N. Paricahua Pari
I3	Solicitud formal de estadísticas agregadas por zona, sabiendo que los datos detallados son reservados.	Semana 6; oficio	Viviana M. Quisbert Quispe
I4	Presentar cada entregable del curso y aplicar sus observaciones.	Cada entrega del curso	Clyde N. Paricahua Pari
I5	Mostrar el mapa por horario y recoger qué información les sirve para patrullar.	Semanas 10 y 15; reunión	Eliseo Tarqui Ajahuana
I6	Charlas con juntas vecinales para captar reportes ciudadanos y explicar el anonimato.	Semanas 10 y 12; reunión vecinal	Viviana M. Quisbert Quispe
I7	Piloto de la ruta segura con 10 participantes y encuesta de confianza.	Semana 15; Google Forms	Ruth K. Apaza Solis
I8	Revisar términos de uso del servidor y de los mapas abiertos.	Mensual	Eliseo Tarqui Ajahuana

6. Necesidades que se Convierten en Requisitos

Interesado	Necesidad expresada	Requisito
Serenazgo (I5)	Saber en qué horario es más riesgosa cada zona	RF-H05 Capas por horario
Juntas vecinales (I6)	Reportar sin exponerse	RF-H06 Reporte anónimo y moderado
Ciudadanos (I7)	Elegir la ruta más segura, no solo la más corta	RF-H04 Ruta segura
Policía (I3)	No exponer datos reservados ni personas	RNF-H03 Privacidad

7. Seguimiento del Registro

- **Verificar:** cada martes se revisa si algún interesado cambió de poder, de interés o de postura.
- **Adaptar:** al cierre de cada fase se actualiza este registro y su plan de involucramiento.

8. Firmas

En señal de conformidad con el presente registro, los integrantes del equipo firman a continuación:

Clyde Neil Paricahua Pari
Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis
Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana
Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe
Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación
