PLAN Y REGISTRO DE RIESGOS

CasaScore (AlquilaPuno)

Fecha: viernes 06/11/2026 (semana 11) | **Versión:** 1.1 | **Fase:** Monitoreo

1. Datos Generales

Proyecto:	CasaScore (aplicación AlquilaPuno)
Responsable:	Viviana Mary Quisbert Quispe – Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación
Proceso PM4DEV:	Gestión de riesgos
Insumos:	Acta de Constitución, cronograma, presupuesto, registro de interesados e informe de desempeño al corte de la semana 11
Versiones:	1.0 del 22/09/2026 (línea base) y 1.1 del 06/11/2026 (activación de R02, nuevo R08 y recalificación de R07)

2. Enfoque

Un riesgo es un evento incierto que, si ocurre, afecta el alcance, el tiempo, el costo o la calidad del proyecto. La gestión sigue cuatro pasos de PM4DEV:


1. **Identificar:** lluvia de ideas del equipo a partir de la EDT, el cronograma y el presupuesto. Cada riesgo se redacta como causa, evento y efecto.
2. **Analizar:** se califican la probabilidad y el impacto con la escala de 1 a 3; la severidad es su producto.
3. **Planificar la respuesta:** cada riesgo tiene una estrategia, una respuesta concreta, un disparador que avisa que está por ocurrir y un responsable.
4. **Monitorear:** el registro se revisa cada martes en la reunión de control.

3. Escalas de Calificación

Valor	Probabilidad	Impacto
1	Baja: hasta 20 %	Bajo: retraso menor a 3 días o costo menor a S/ 100; no afecta a los clientes.
2	Media: de 21 % a 50 %	Medio: retraso de 3 a 7 días o costo de S/ 100 a S/ 300; afecta una función secundaria.
3	Alta: más de 50 %	Alto: retraso mayor a una semana o costo mayor a S/ 300; pone en riesgo un hito, el piloto o un objetivo del Acta.

Severidad (P × I)	Nivel	Tratamiento
6 a 9	ALTA	Respuesta activa desde ahora y revisión cada semana.
3 a 4	MEDIA	Respuesta planificada; se revisa cada semana su disparador.
1 a 2	BAJA	Se acepta y se revisa al cierre de cada fase.

4. Matriz de Severidad

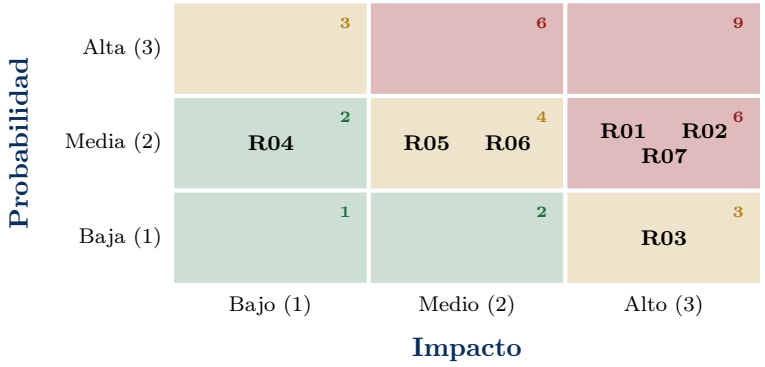

5. Registro de Riesgos

Ordenado de mayor a menor severidad. P: probabilidad; I: impacto; Sev.: severidad.

ID	Riesgo	P	I	Sev.	Estrategia	Respuesta	Disparador
R01	Si pocos propietarios aceptan publicar, el ranking tendrá pocos cuartos y el piloto perderá valor.	2	3	6	Mitigar	Visitas de campo con la guía de publicación y acompañamiento por WhatsApp; dos visitas adicionales si es necesario.	Menos de 8 cuartos registrados al cierre de la semana 6.
R02	Si la migración de SQLite a Supabase toma más de lo previsto, se retrasan el registro, la nube y el MVP final.	2	3	6	Mitigar	Práctica guiada con Supabase antes de la semana 9 y prueba de conexión en un proyecto aparte; dos jornadas nocturnas si el retraso persiste.	Inicio de sesión sin funcionar al cierre de la semana 10.
R07	Si pocos arrendatarios se inscriben en el piloto, no se podrá medir la satisfacción con la muestra prevista.	2	3	6	Mitigar	Convocatoria en grupos de WhatsApp de estudiantes, afiches en la ciudad universitaria e incentivos para los participantes.	Menos de 10 arrendatarios inscritos al cierre de la semana 12.
R05	Si un integrante enferma o se ausenta, sus tareas se retrasan.	2	2	4	Mitigar	Cada tarea queda documentada en su Issue y tiene un integrante de apoyo que puede continuarla.	Ausencia mayor a una semana.
R06	Si Supabase o el servicio de mapas abiertos limitan su plan gratuito, la app puede dejar de funcionar o generar costos.	2	2	4	Mitigar	Fotos comprimidas antes de subirlas, uso moderado de los mapas, actividad semanal en la base de datos y revisión mensual de los términos de uso.	Uso mayor al 70 % de algún límite del plan gratuito.
R03	Si una laptop o el celular de pruebas falla o es robado, se pierden días de trabajo.	1	3	3	Mitigar	Todo el código y los documentos se suben a GitHub cada día; se repara el equipo o se alquila uno de reemplazo.	Equipo inutilizado por más de 2 días.
R04	Si suben los precios de alimentación y transporte, el gasto en efectivo supera el aporte previsto.	2	1	2	Aceptar	Se cubre con la contingencia y se compara cada mes el gasto real con el previsto.	Gasto mensual 10 % mayor que el previsto.

6. Responsables y Presupuesto de Contingencia

La contingencia de cada riesgo es su valor esperado (probabilidad × impacto en soles), calculado en el presupuesto del proyecto. Los riesgos sin costo se tratan con acciones del equipo; si llegan a requerir dinero, se usa la reserva de gestión (S/ 1,166.35) con una solicitud de cambio.

ID	Categoría	Responsable del riesgo	Contingencia S/
R01	Clientes	Clyde N. Paricahua Pari	150.00
R02	Técnico	Eliseo Tarqui Ajahuana	200.72
R03	Recursos	Viviana M. Quisbert Quispe	80.00
R04	Costos	Ruth K. Apaza Solis	68.60
R05	Equipo	Clyde N. Paricahua Pari	56.08
R06	Técnico	Eliseo Tarqui Ajahuana	sin costo
R07	Clientes	Viviana M. Quisbert Quispe	sin costo
R08	Cronograma	Ruth K. Apaza Solis	sin costo
Reserva de contingencia			**555.40**

7. Estrategias de Respuesta

Estrategia	Cuándo se usa
Evitar	Se cambia el plan para eliminar la causa del riesgo.
Mitigar	Se actúa antes para bajar la probabilidad o el impacto.
Transferir	Se traslada el impacto a un tercero, por ejemplo con una garantía.
Aceptar	Se asume el riesgo y se cubre con la contingencia si ocurre.

8. Monitoreo y Control

- **Martes:** la Gestora revisa los disparadores; si uno se activa, el responsable ejecuta la respuesta y se registra en el acta.
- **Nuevos riesgos:** cualquier integrante puede proponerlos en un Issue de GitHub con la etiqueta `riesgo`; se califican en la siguiente reunión.
- **Uso de la contingencia:** se anota el riesgo, el monto y el comprobante; la Analista de Planificación actualiza el saldo.
- **Cierre de un riesgo:** cuando su causa desaparece o pasa su ventana de tiempo, se marca como cerrado.
- **Actualización:** el registro se versiona en el repositorio al cierre de cada fase.

9. Seguimiento del Registro al 06/11/2026

Revisión de los disparadores con el corte de la semana 11 (SPI 0.87 y CPI 0.95). Las calificaciones de la versión 1.0 se mantienen como línea base para comparar.

ID	Riesgo	P	I	v1.0	v1.1	Situación y respuesta	Estado
R02	Retraso en la migración a Supabase	3	3	6	9	El disparador se cumplió: el inicio de sesión no funcionaba al cierre de la semana 10 y la migración va al 40 % (debía ir al 89 %). Ruth apoya la seguridad por fila y Eliseo se concentra en el registro; el hito pasa del 10/11 al 18/11.	Activado
R08	Nuevo: si el registro en la nube no está listo, el piloto no puede hacerse en la semana 13	2	3	–	6	Evitar: solicitud de cambio SC-02 para mover el piloto a la semana 14 (23 al 27/11), sin mover el MVP final ni el cierre.	Nuevo
R01	Pocos propietarios dispuestos a publicar	2	3	6	6	10 de 15 cuartos registrados con las visitas de los sábados. Se propone una meta de 12 cuartos, suficiente para 10 arrendatarios y 5 propietarios.	Vigilancia
R07	Baja adopción en el piloto	2	2	6	4	14 arrendatarios inscritos por los grupos de WhatsApp y los afiches; el impacto baja porque la muestra mínima de 10 ya está cubierta.	Vigilancia
R05	Enfermedad o ausencia de un integrante	2	2	4	4	Sin ausencias en el periodo.	Sin cambio
R06	Límites del plan gratuito	2	2	4	4	Uso de Supabase menor al 10 % de sus límites.	Sin cambio
R03	Falla o robo de un equipo	1	3	3	3	Sin incidentes; todo se sube a GitHub cada día.	Sin cambio
R04	Alza de precios	2	1	2	2	El gasto en efectivo va por debajo de lo previsto.	Sin cambio

La respuesta a R02 reasigna horas del equipo y no requiere gasto, por lo que la contingencia (S/ 555.40) sigue sin uso. R08 no suma contingencia porque se responde con un cambio de fechas.

10. Firmas

En señal de conformidad con el presente documento, los integrantes del equipo firman a continuación:

Clyde Neil Paricahua Pari
Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis
Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana
Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe
Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación
