PLAN DEL EQUIPO

CasaScore (AlquilaPuno)


Fecha: viernes 18/09/2026 (semana 4) | **Versión:** 1.0 | **Fase:** Planificación

1. Datos Generales

Proyecto:	CasaScore (AlquilaPuno)
Responsable:	Ruth Karina Apaza Solis – Analista de Planificación
Proceso PM4DEV:	Gestión del equipo del proyecto
Insumos:	Acta de conformación del equipo, Acta de Constitución y EDT
Periodo:	Semanas 2 a 17 del semestre 2026-II (16 semanas)

2. Organigrama

El equipo tiene una estructura plana: el Project Manager coordina a tres roles especializados y el docente del curso acompaña como asesor, fuera de la línea de mando.

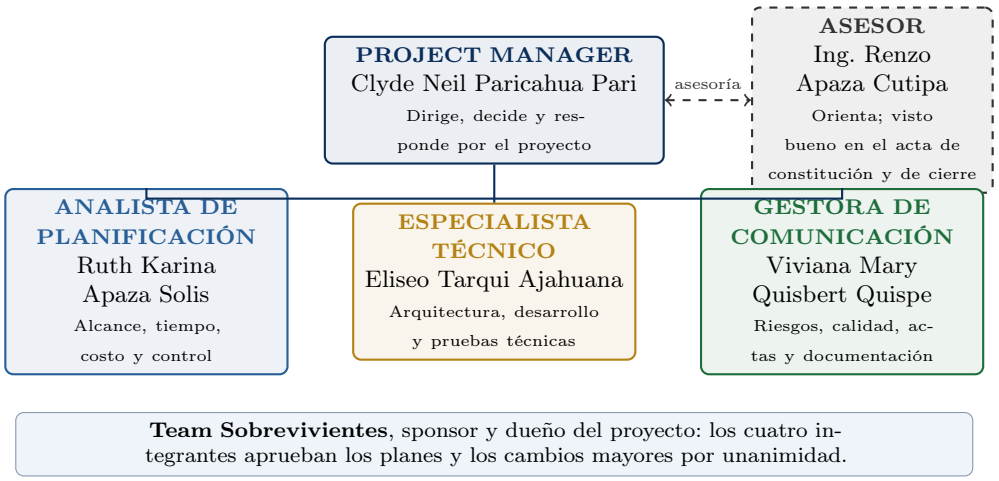

3. Roles y Responsabilidades

Rol	Propósito	Responsabilidades	Reporta a	Cómo se evalúa
Project Manager Clyde Neil Paricahua Pari	Dirigir el proyecto para cumplir alcance, tiempo, costo y satisfacción del cliente.	Conducir las reuniones; aprobar entregables como responsable final; gestionar interesados externos y la relación con el asesor; decidir sobre cambios menores.	Equipo (sponsor) y asesor	Entregables aprobados a tiempo y decisiones registradas en actas.
Analista de Planificación Ruth Karina Apaza Solis	Mantener las líneas base de alcance, tiempo y costo y medir el avance.	EDT, cronograma y presupuesto; registro de horas y gastos; valor ganado y tablero de control semanal.	Project Manager	Informe de avance cada martes y desviaciones de costo y plazo menores a 10 %.
Especialista Técnico Eliseo Tarqui Ajahuana	Construir un producto que funcione y cumpla los requerimientos.	Arquitectura, base de datos y algoritmos; desarrollo de las funciones; revisión técnica de los Pull Request; manuales.	Project Manager	Funciones terminadas por sprint y 0 errores críticos en la entrega.
Gestora de Comunicación Viviana Mary Quisbert Quispe	Asegurar la calidad, controlar los riesgos y mantener informados a los interesados.	Políticas y actas; registro de riesgos; plan de calidad y pruebas; comunicaciones y expediente en LaTeX; lecciones aprendidas.	Project Manager	Actas al día, riesgos revisados cada semana y casos de prueba ejecutados.

4. Tabla de Habilidades

La tabla compara las habilidades que exige cada rama de la EDT con el nivel de cada integrante. Las celdas **Básica** en una rama muestran dónde el integrante necesita apoyo o capacitación.

Rama de la EDT	Habilidad requerida	Clyde	Ruth	Eliseo	Viviana
1 Gestión del proyecto	Gestión, planificación y costos	Alta	Alta	Básica	Media
2 Análisis y diseño	Requerimientos, modelo de datos y bocetos	Media	Media	Alta	Básica
3 Construcción del software	Expo, React Native, TypeScript, SQLite y Supabase	Básica	Básica	Alta	Básica
4 Pruebas y validación	Casos de prueba, encuestas y trato con clientes	Alta	Media	Media	Alta
5 Cierre	Redacción técnica, LaTeX y exposición	Alta	Media	Básica	Alta

Brechas y acciones


Brecha	Acción	Responsable
Construcción concentrada en el Especialista Técnico (lidera todos los paquetes de la rama 3).	Los demás integrantes apoyan en pruebas, datos y pantallas sencillas; revisión de código en cada Pull Request.	Eliseo Tarqui Ajahuana
Uso de Supabase y seguridad por fila, nuevo para el equipo.	Práctica guiada antes de la semana 9 con la documentación oficial.	Eliseo Tarqui Ajahuana

5. Matriz de Asignación

Todos los integrantes dedican la misma carga: **8 horas por semana** durante 16 semanas, es decir 128 horas cada uno y 512 horas del equipo, igual al total de la EDT. Sumadas a las 8 horas semanales de Horus Sentinel, cada integrante trabaja 16 horas por semana en la cartera del equipo.

Integrante	Rama 1	Rama 2	Rama 3	Rama 4	Rama 5	Total h	h/sem.
Clyde Neil Paricahua Pari	56	8	24	24	16	**128**	**8**
Ruth Karina Apaza Solis	56	16	24	24	8	**128**	**8**
Eliseo Tarqui Ajahuana	16	32	64	8	8	**128**	**8**
Viviana Mary Quisbert Quispe	40	8	48	16	16	**128**	**8**
Total	**168**	**64**	**160**	**72**	**48**	**512**	**32**

Distribución de las horas de cada integrante por rama

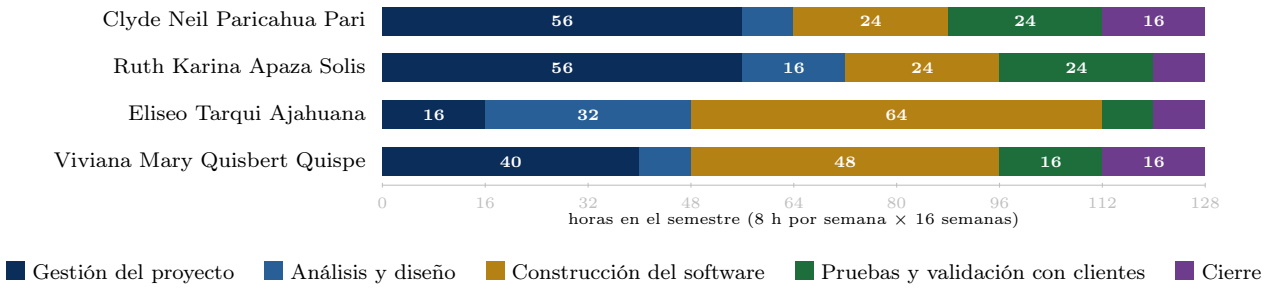

6. Matriz RACI

Cada paquete de trabajo tiene un solo responsable de ejecutarlo y un solo responsable de aprobarlo.

- **R** Responsable: ejecuta y dirige el paquete.
- **A** Aprueba: acepta el entregable y responde por él.
- **C** Consultado: aporta antes y durante el trabajo.
- **I** Informado: conoce el resultado.

Cód.	Paquete de trabajo	Clyde	Ruth	Eliseo	Viviana	Asesor
1	**Gestión del proyecto**					
1.1	Gobernanza del equipo	A	C	I	R	–
1.2	Viabilidad y Acta de Constitución	A/R	C	I	C	C
1.3	Planificación base	A	R	I	C	–
1.4	Planes de soporte	A	C	I	R	–
1.5	Seguimiento y control	A	R	I	C	–
1.6	Entregas de la Unidad II	A/R	C	I	C	I
2	**Análisis y diseño**					
2.1	Ficha técnica y requerimientos	A	C	R	I	–
2.2	Modelo de datos y arquitectura	A	C	R	I	–
2.3	Diseño de pantallas	A	C	R	I	–
3	**Construcción del software**					
3.1	Motor CASA SCORE	A	I	R	C	–
3.2	Publicación de cuartos	A	I	R	C	–

Cód.	Paquete de trabajo	Clyde	Ruth	Eliseo	Viviana	Asesor
3.3	Ranking y detalle (MVP Unidad I)	A	I	R	C	–
3.4	Nube, registro e inicio de sesión	A	I	R	C	–
3.5	Punto de referencia y nuevos criterios	A	I	R	C	–
3.6	Perfil y mis cuartos	A	I	R	C	–
4	**Pruebas y validación con clientes**					
4.1	Pruebas del motor	A	I	C	R	–
4.2	Levantamiento de cuartos	A/R	I	C	I	–
4.3	Piloto con clientes	A	R	C	I	–
4.4	Pruebas de aceptación	A	I	C	R	–
5	**Cierre**					
5.1	Manuales	A	C	R	C	–
5.2	Informe final y exposición	A/R	C	C	C	I
5.3	Lecciones aprendidas y acta de cierre	A	C	C	R	C

7. Desempeño del Equipo

El desempeño se gestiona con el ciclo de PM4DEV: Planificar, Hacer, Verificar y Adaptar.

Etapa	Qué se hace	Cuándo
Planificar	Cada paquete de la EDT se convierte en Issues de GitHub con responsable, fecha y horas estimadas.	Al inicio de cada sprint
Hacer	Cada integrante registra sus horas reales y cierra sus Issues con el entregable adjunto.	Durante la semana
Verificar	Se comparan las horas y los entregables con lo asignado. Metas: 90 % o más de horas cumplidas y 90 % o más de entregables a tiempo.	Martes, reunión de control
Adaptar	Si un integrante queda por debajo de la meta dos semanas seguidas, se acuerda un apoyo o se reasignan tareas. Al cierre de cada fase, cada integrante evalúa a los demás con una escala de 1 a 5.	Viernes y cierre de fase

8. Incorporación y Liberación

- **Incorporación:** los cuatro integrantes participan desde la semana 2; no se prevé incorporar personas externas.
- **Reemplazo:** si un integrante se retira, sus paquetes se reasignan según la tabla de habilidades y se actualiza esta matriz.
- **Liberación:** el equipo se libera en la semana 17, después del acta de cierre y del registro de lecciones aprendidas.

9. Firmas

En señal de conformidad con el presente plan, los integrantes del equipo firman a continuación:

Clyde Neil Paricahua Pari
Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis
Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana
Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe
Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación
